



27 mai 2017 — Sites du Sellaret et des Oures (alt. 1900 m.)

Au Sellaret :

- Reconstruction du boyau du tunnel du **Sellaret**, en rive droite du torrent issu du Grand Sellar, sur 1.5 mètre environ.
- Collecte de dalles de grès à tailler pour reconstituer la voûte du tunnel.
- Nouvel examen du site au point de bifurcation du canal vers les ouvrages. Notamment, étude du nivellement.
- Entretien général du site du Sellaret.

Aux Oures :

- Reconstruction des ébauches du mur Est de la martelière des **Oures**.
- Collecte de blocs de grès pour taille à fin de maçonnerie à l'identique du mur Ouest.



Reconstruction des ébauches du mur Est de la martelière des Oures. Objectif : donner à voir le volume du bassin.



Élévation de l'ébauche gauche selon appareillage du mur Ouest visible en fond sur la photo.



Préparation de blocs pour la reconstruction.




Vue de l'ébauche gauche permettant d'en apprécier l'épaisseur.



Collecte et sélection de blocs pour la reconstruction.



Ébauche en cours de remontage.

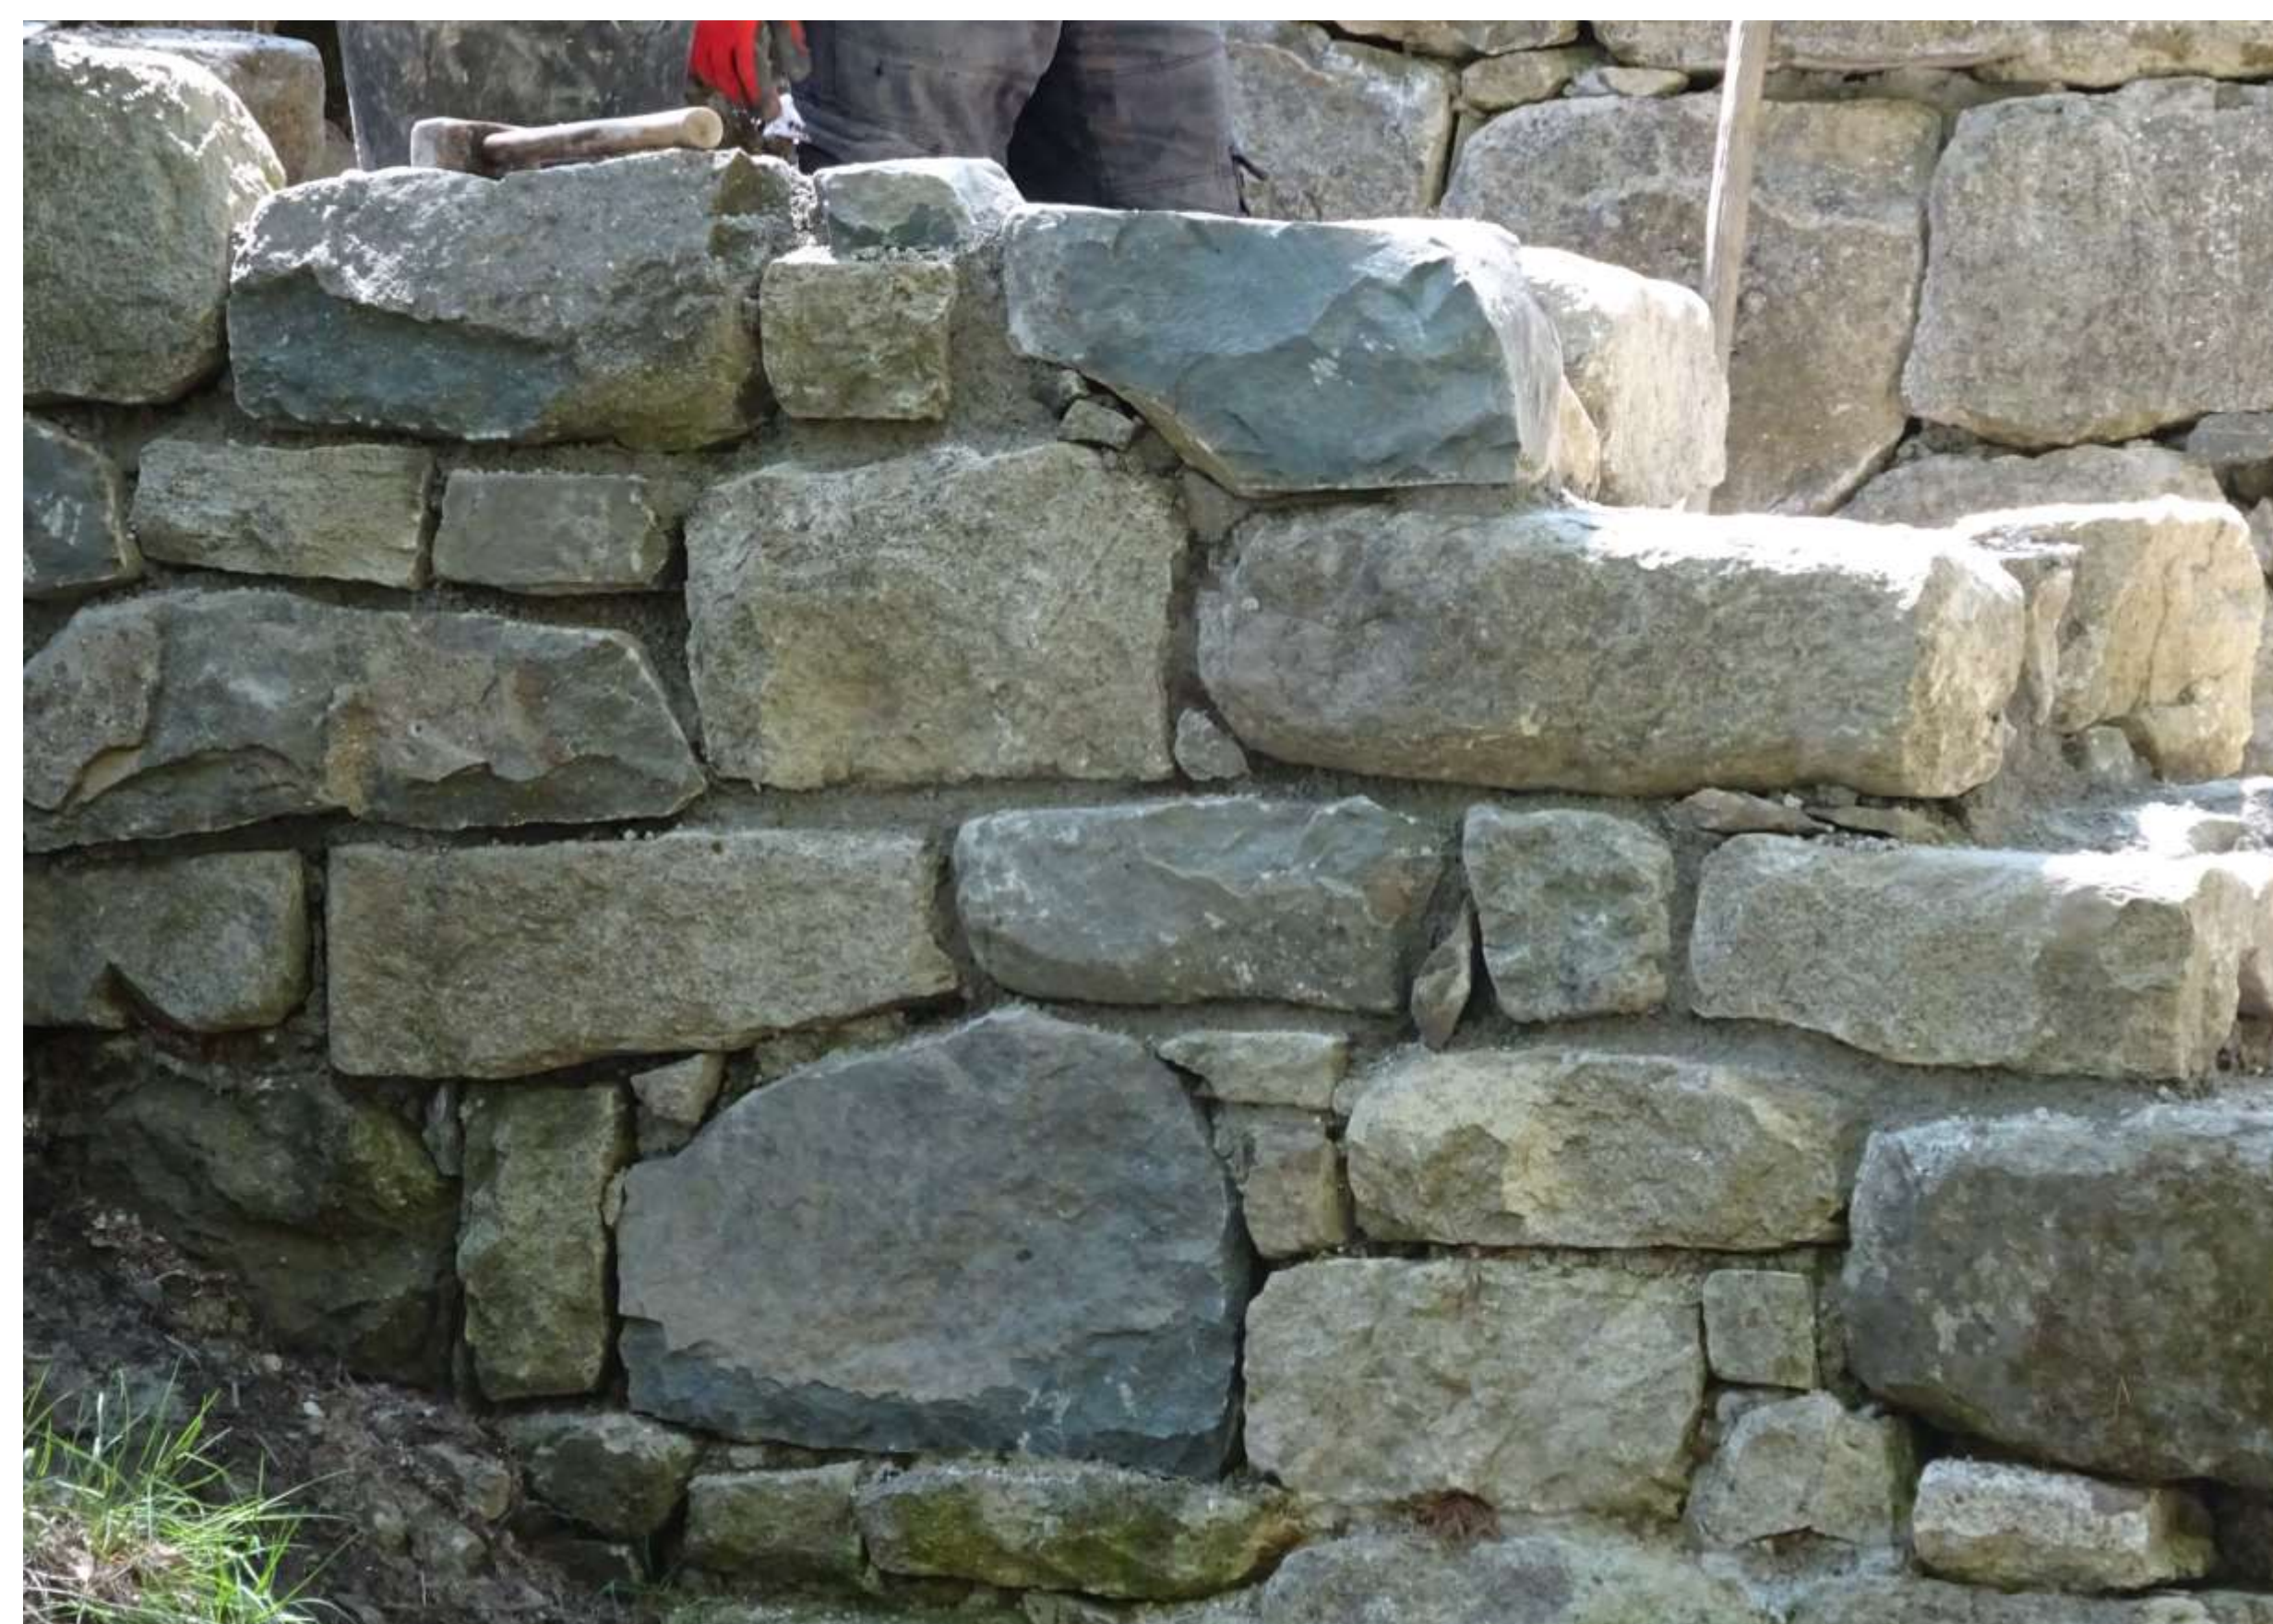

Détail du montage.



Vue d'ensemble en fin de journée. Chantier à poursuivre en 2018.

Canal de Malcros Travaux effectués en 2017



Association loi 1901
Sauvegarde et restauration
du canal de Malcros
Mairie — 05260 Saint-Michel
de Chaillol

30 juin, 1er et 2 juillet 2017 — chantier d'altitude, col de Riou Beyrou — site de la cabane des parisiens (alt. 2700 m.)

- Enneigement modéré, compatible avec nos travaux et avec l'organisation de la vie sur les trois jours. Une dégradation dans les jours précédant le chantier en a cependant un peu compliqué le déroulement.

Les travaux prévus ont cependant pu être réalisés :

- amélioration sensible du passage en banquette sur la corniche du Vieux Chaillol, au-delà du col de Riou Beyrou ;
- évaluation de l'état de la voûte du tunnel supérieur par Maxime Pottier, chargé de mission architecture du patrimoine. Bon état général, recharger le demi cintre aval contribuerait à préserver l'ouvrage ;
- le rééquilibrage de charge sur la moitié amont de la voûte du tunnel est entamé sur le champ. Une première trentaine de mètres a été réalisée ;
- **Entre le 23 et le 28 juillet 2017** : éboulement majeur. La voûte cède en deux points. Dégâts importants.



Amélioration de la banquette permettant d'accéder au tunnel, dans le vallon de Malcros.



Éboulement majeur entre le 23 et le 28 juillet. Des blocs de plusieurs tonnes se détachent de la falaise sommitale.



30 juin, ouverture du chantier, le Vieux Chaillol est plâtré de la neige tombée dans la nuit.



Évaluation de l'état des 114 mètres de la voûte du tunnel supérieur par Maxime Pottier.



Le tunnel est littéralement pulvérisé sur plusieurs mètres en deux emplacements.



Certes, les conditions ne sont pas les meilleures, mais le chantier va s'organiser. D'autres compagnons vont monter.



Mur de blocs en cours de montage le long du boyau, afin de maintenir une charge égale de part et d'autre de la voûte.



La voûte encore en place a été déformée par l'impact.
